ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Estimeret tidsplan - 231 AB Brydesgård REV 00	5 days	Mon 20-02-17	Mon 27-02-17
2	Etablering af byggeplads. Skurvogn, platform, container og evt. byggepladshegn opsættes.	5 days	Mon 20-02-17	Mon 27-02-17
3	Platform 1	56 days	Tue 28-02-17	Tue 13-06-17
4	Opstilling 1 (MJØ 14 TV) 3 gadealtaner	12 days	Tue 28-02-17	Mon 20-03-17
5	Montering af facadealtan inkl. Dør, Altan nr. 30+31+32	11 days	Tue 28-02-17	Thu 16-03-17
6	Flyt af platform	1 day	Mon 20-03-17	Mon 20-03-17
7	Opstilling 2 (MJØ 14 th+12 tv) 3 gadealtaner	10 days	Tue 21-03-17	Wed 05-04-17
8	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 23+24+26	9 days	Tue 21-03-17	Tue 04-04-17
9	Flyt af platform	1 day	Wed 05-04-17	Wed 05-04-17
10	Opstilling 3 (MJØ 12 th+10 tv) 4 gadealtaner	13 days	Thu 06-04-17	Wed 03-05-17
11	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 16+18+19+20	12 days	Thu 06-04-17	Tue 02-05-17
12	Flyt af platform	1 day	Wed 03-05-17	Wed 03-05-17
13	Opstilling 4 (BJØ 10 th + 8 tv) 3 gadealtaner	11 days	Thu 04-05-17	Tue 23-05-17
14	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 7+8+11	10 days	Thu 04-05-17	Mon 22-05-17
15	Flyt af platform	1 day	Tue 23-05-17	Tue 23-05-17
16	Opstilling 5 (MJØ 8 th) 3 gadealtaner	10 days	Wed 24-05-17	Tue 13-06-17
17	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 2+3+4	9 days	Wed 24-05-17	Mon 12-06-17
18	Flyt af platform	1 day	Tue 13-06-17	Tue 13-06-17
19	Platform 2	73 days	Tue 28-02-17	Wed 12-07-17
20	Opstilling 6 (LYS 5 tv + 5 th) 2 tagaltaner + 6 facadealtaner	73 days	Tue 28-02-17	Wed 12-07-17
21	Montering af Tagaltaner inkl. Dør og tagarbejder nr. 34+38	21 days	Tue 28-02-17	Tue 04-04-17
22	Montering af facadealtan inkl. Dør og omvendt hygldeknægt nr. 35+39	10 days	Wed 05-04-17	Tue 25-04-17
23	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 36+37+40+41	11 days	Wed 26-04-17	Tue 16-05-17
24	Flyt af platform	1 day	Wed 17-05-17	Wed 17-05-17
25	Opstilling 7 (LYS 7 tv + th) 1 tagaltan, 5 facadealtaner	30 days	Thu 18-05-17	Wed 12-07-17
26	Montering af Tagaltaner inkl. Dør og tagarbejder nr. 46	10 days	Thu 18-05-17	Wed 07-06-17
27	Montering af facadealtan inkl. Dør og omvendt hygldeknægt nr. 43+47	10 days	Thu 08-06-17	Mon 26-06-17
28	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 44+45+49	9 days	Tue 27-06-17	Tue 11-07-17
29	Flyt af platform	1 day	Wed 12-07-17	Wed 12-07-17
30	Platform 3	53 days	Tue 07-03-17	Wed 14-06-17
31	Opstilling 8 (LYS 9 tv + th) 2 tagaltan, 3 facadealtaner	32 days	Tue 07-03-17	Thu 04-05-17
32	Montering af Tagaltaner inkl. Dør og tagarbejder nr. 50+54	20 days	Tue 07-03-17	Mon 10-04-17
33	Montering af facadealtan inkl. Dør og omvendt hygldeknægt nr. 51	5 days	Tue 11-04-17	Thu 20-04-17
34	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 53+56	6 days	Mon 24-04-17	Wed 03-05-17
35	Flyt af platform	1 day	Thu 04-05-17	Thu 04-05-17
36	Opstilling 9 (LYS 11 tv + th) 1 tagaltan, 3 facadealtaner	21 days	Mon 08-05-17	Wed 14-06-17
37	Montering af Tagaltaner inkl. Dør og tagarbejder nr. 62	10 days	Mon 08-05-17	Tue 23-05-17
38	Montering af facadealtan inkl. Dør og omvendt hygldeknægt nr. 59	5 days	Wed 24-05-17	Thu 01-06-17
39	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 61+65	6 days	Tue 06-06-17	Wed 14-06-17
40	Platform 4	72 days	Mon 13-03-17	Mon 07-08-17
41	Opstilling 10 (BRY 13tv +11th) 1 tagaltan, 5 facadealtaner	36 days	Mon 13-03-17	Wed 17-05-17
42	EVT .Overlægger over port indmures. (BEMÆRK ekstraarbejde)	1 day	Mon 13-03-17	Mon 13-03-17
43	Montering af Tagaltaner inkl. Dør og tagarbejder nr. 69	10 days	Tue 14-03-17	Wed 29-03-17
44	Montering af facadealtan inkl. Dør og omvendt hygldeknægt nr. 67+70	10 days	Thu 30-03-17	Wed 19-04-17
45	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 68+71+72	9 days	Thu 20-04-17	Mon 08-05-17
46	Flyt af platform	1 day	Tue 09-05-17	Tue 09-05-17
47	Opstilling 11 (BRY 15 tv) 2 facadealtaner	41 days	Wed 10-05-17	Mon 07-08-17
48	Montering af facadealtan inkl. Dør nr. 75+76	6 days	Wed 10-05-17	Thu 18-05-17
49	Flyt af platform	1 day	Mon 22-05-17	Mon 22-05-17
50	Afrigning og fejl/mangle udbedring.	6 days	Thu 13-07-17	Mon 07-08-17

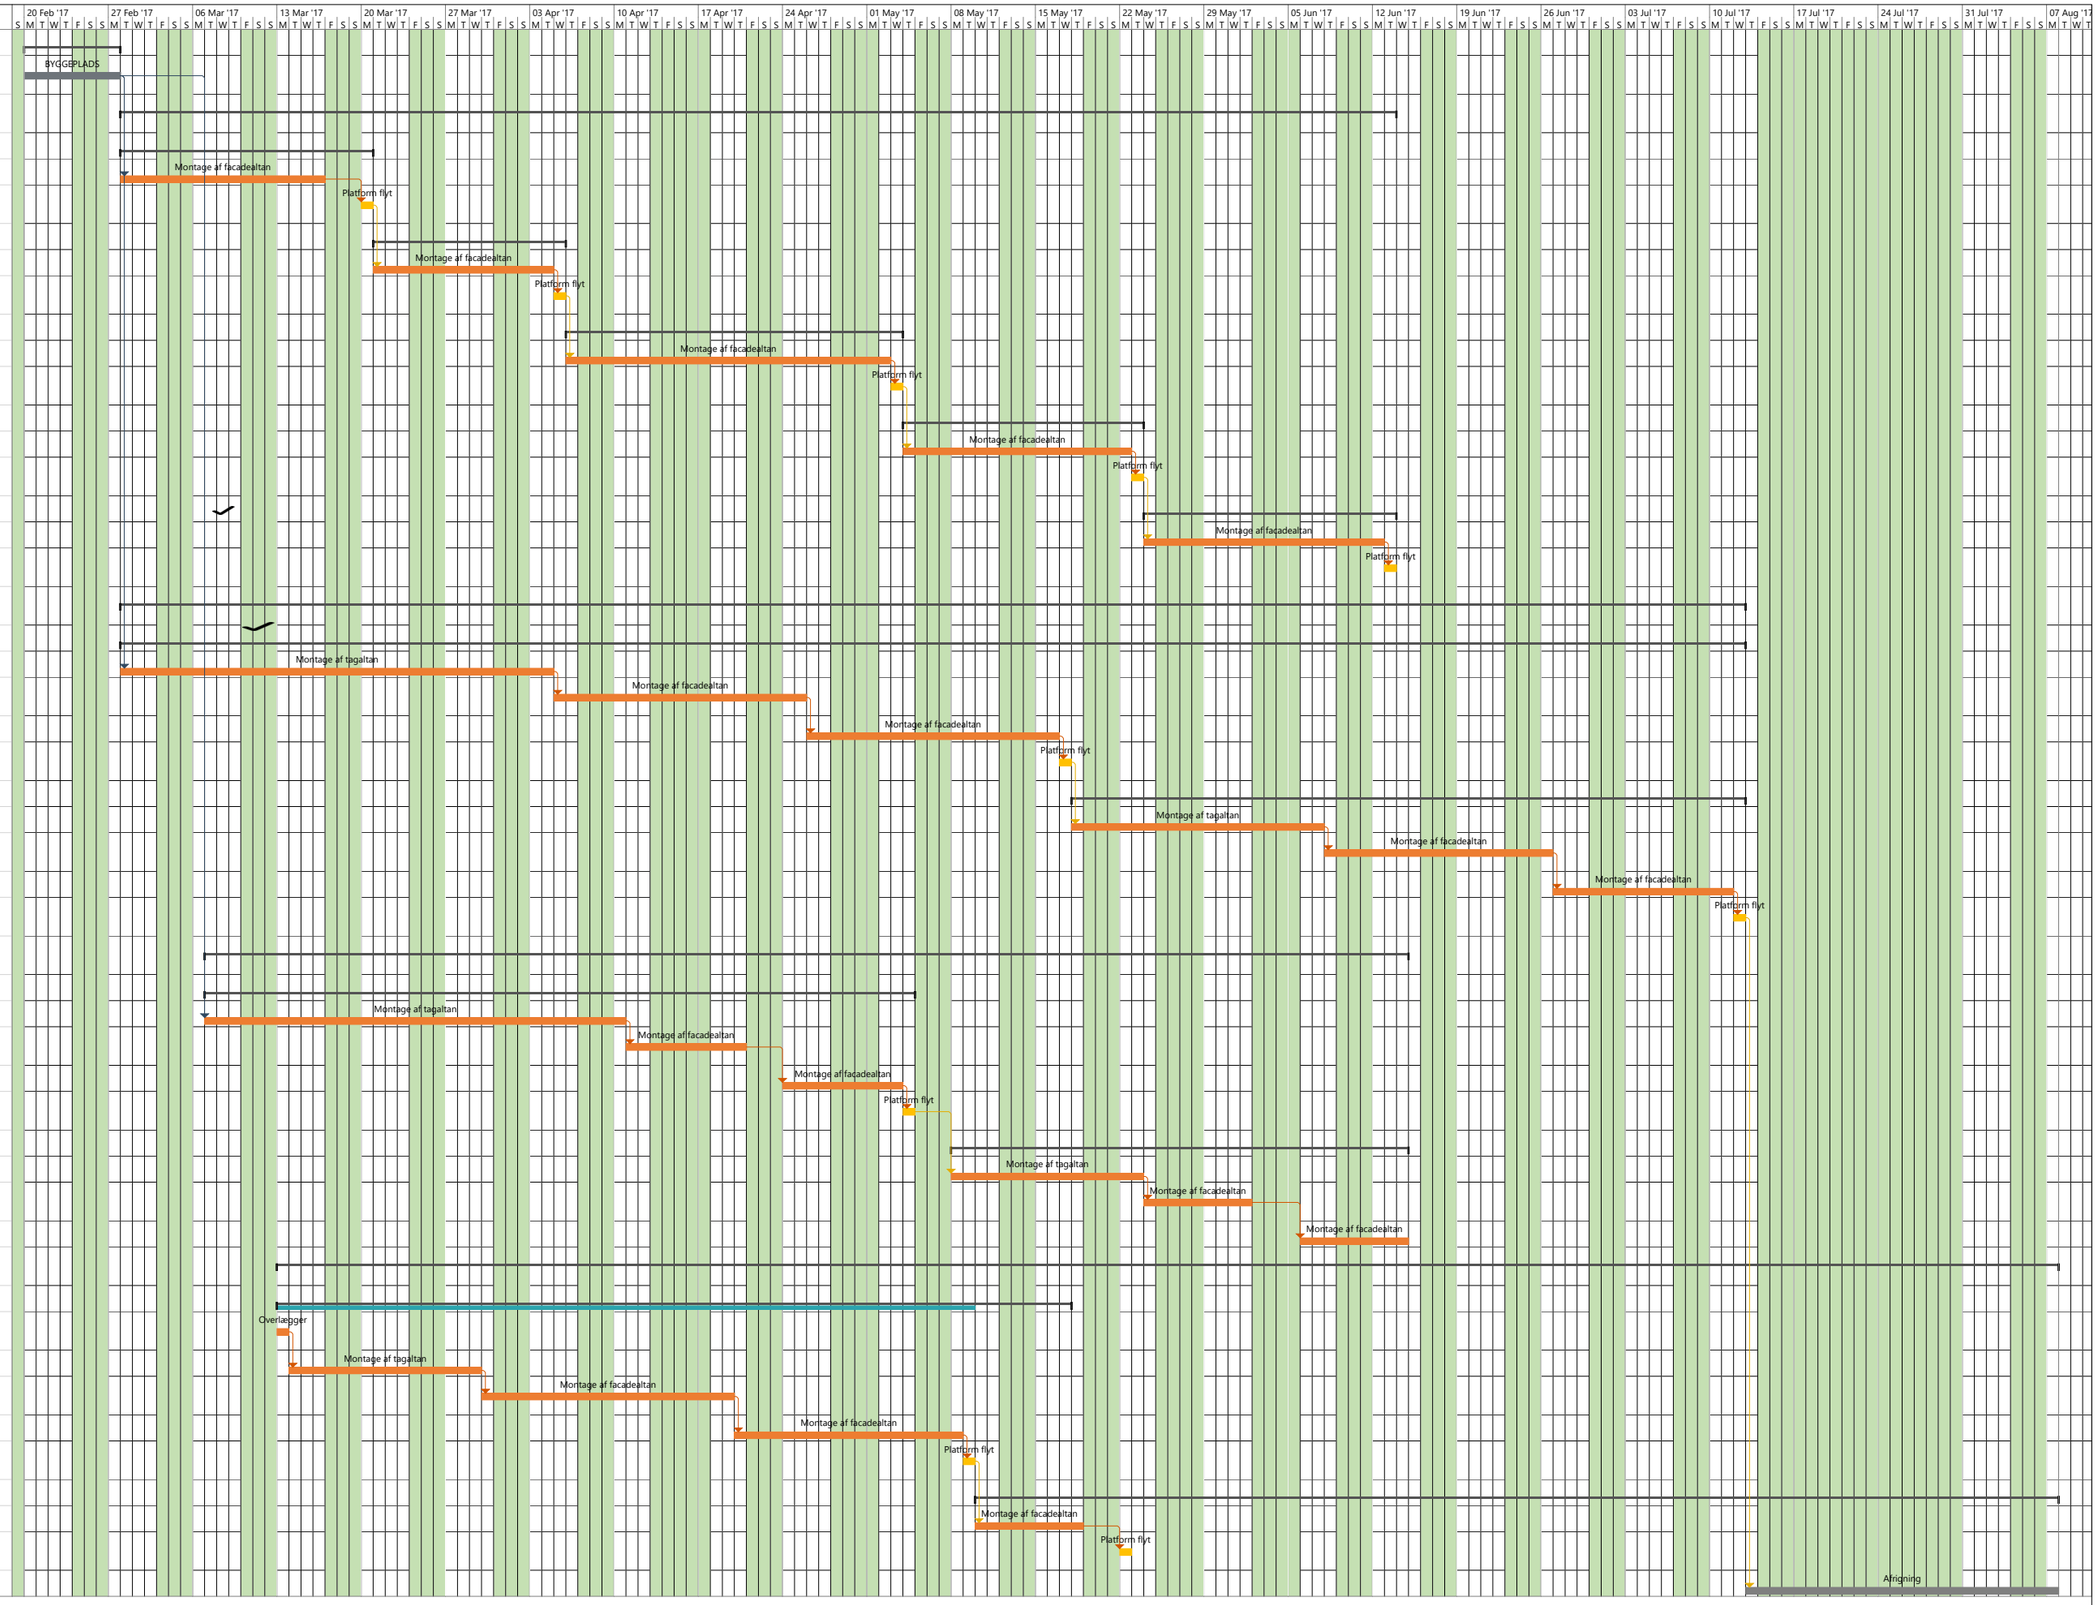

Project: Tidsplan SKABELON
Date: Tue 07-02-17

Task | Milestone | Summary | Progress
